KK GIRDER PROJECT

Girders Daily Status Report

Date: Mon Oct 19 2026 09:58:03

Daily Progress Summary

Sr	Items	Prev	Oct 05	Oct 06	Oct 07	Oct 08	Oct 09	Oct 10	Oct 11	Oct 12	Oct 13	Oct 14	Oct 15	Oct 16	Oct 17	Oct 18	Oct 19	Total
1	Girders Concreted	300	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	302
2	Girders Stressed	242	0	0	6	3	0	0	0	0	0	10	6	0	0	0	0	267
3	Girders Grouted	243	0	0	6	3	0	0	0	0	0	10	6	0	0	0	0	268
4	Girders Launched	251	1	6	4	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	273
5	Diaphragms Concreted	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Production Breakdown

Girders Concrete (In / Out)

Month	Factory	Yard	Total
Old			30
Jan	0	0	0
Feb	0	7	7
Mar	0	20	20
Apr	5	36	41
May	10	16	26
Jun	15	5	20
Jul	16	23	39
Aug	41	32	73
Sep	30	14	44
Oct	1	1	2
Total	118	154	302

Girders Casted By Contractor

Contractor Name	Girders Concreted
Athar Awan	81
Sultan Shah	42
Aftab Ahmed	19
Akbar Khan	102
Company	16
Wada Mistari	30
Abid Ali	12
Total	302

Diaphragms Concreted By
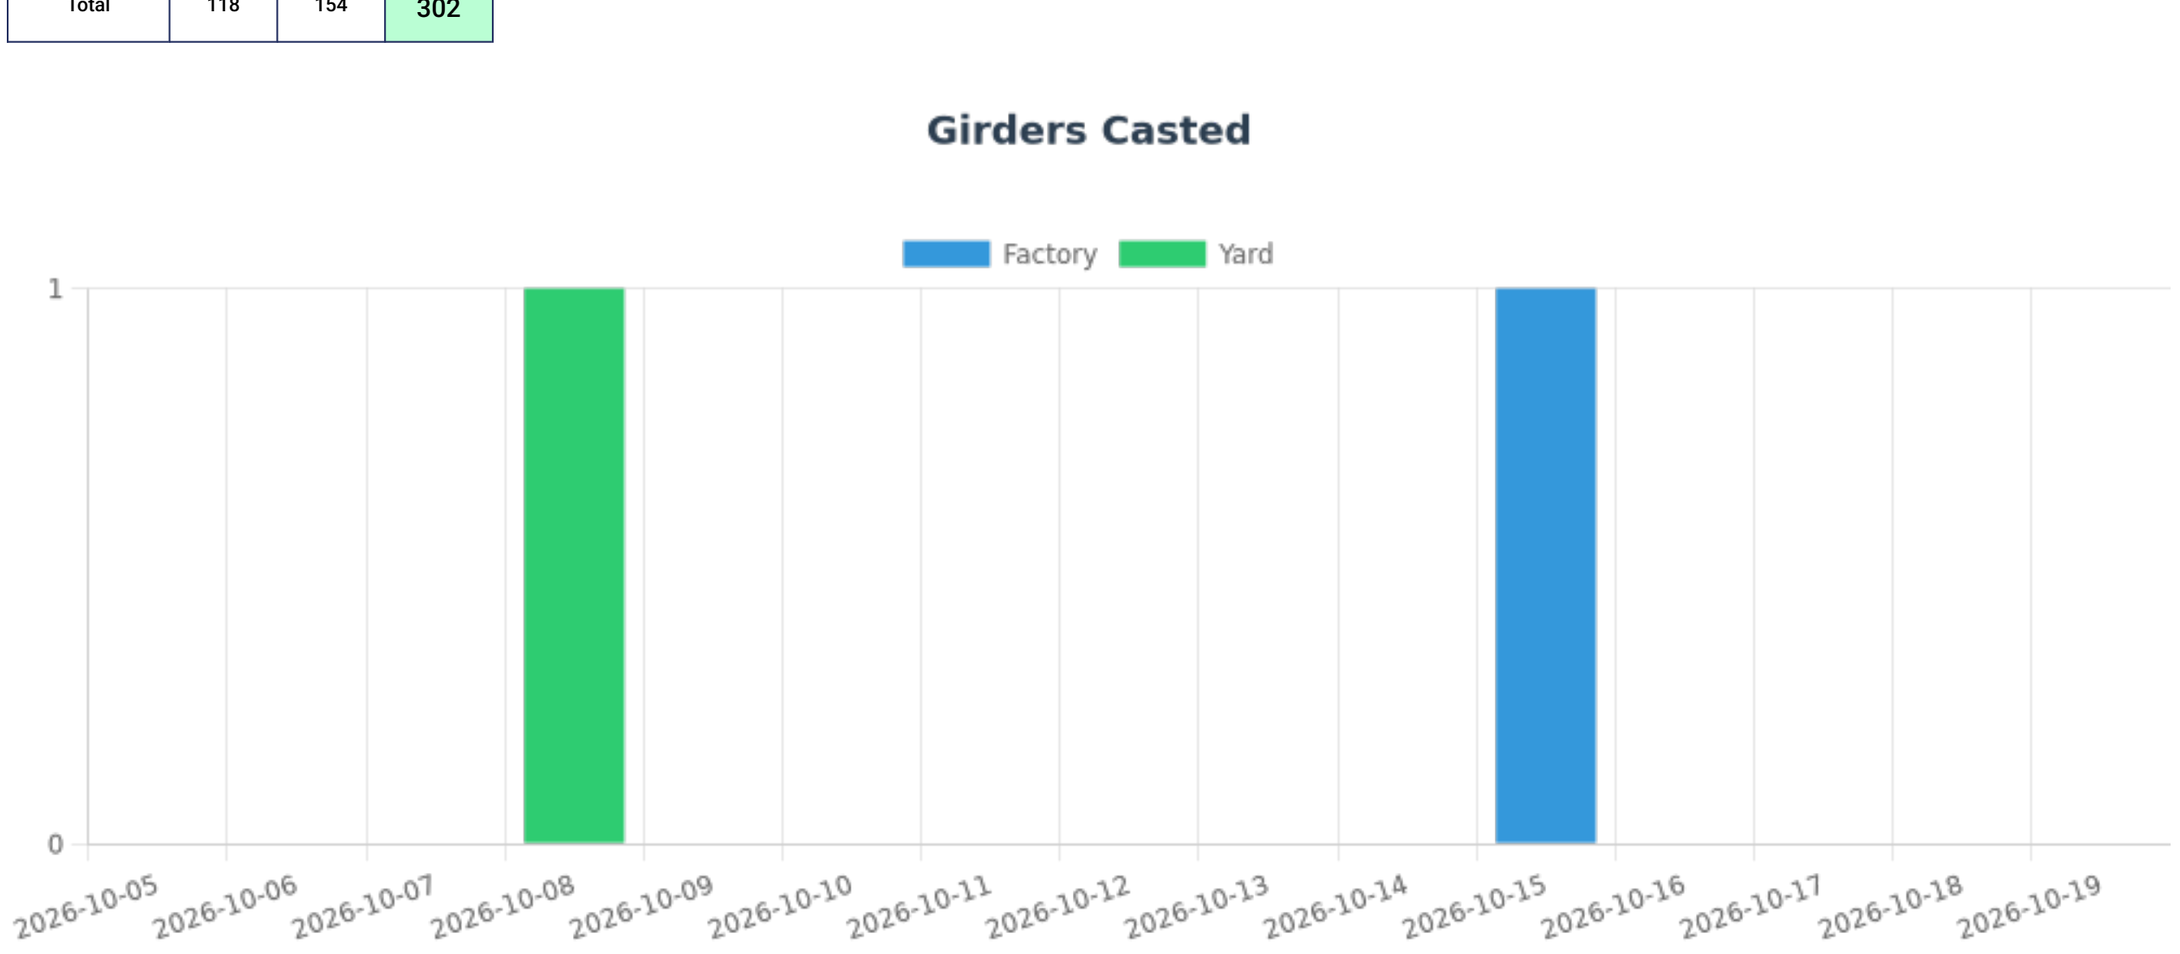
Contractor Name	Diaphragms Concreted
Athar Awan	15
M Atif	15
Total	30
